

- การบริหารส่วนตำบล
- สำนักงานปลัด
 - ส่วนการคลัง
 - ส่วนโยธา
 - ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ปีที่ ๑๓๕๕ (๕)
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ คค ๐๗๑๓/๖๕๖๕

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๘๙๐๕/๐๖๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ
 ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๘๐๖ เลขที่ ๐๑๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวัด - ป่าปะคาบ บ้านคลองวัด หมู่ที่ ๑ ตำบลชุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖
โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑

2806



เลขที่ 015

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ที่ทำการ.....สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก..... นอ.จ. อภินันท์

เป็นค่า..... ค่าธรรมเนียม ทดสอบวัสดุ

จำนวนเงินบาท..... 90.- บาท

(..... -เก้าสิบบาทถ้วน-.....)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน



(ตำแหน่ง)..... (นางสาวเกศกัญญา จันทพงศ์พล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พท. ๒๒๖/๒๕๖๕

รูปการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทะเบียนทดสอบเลขที่	CON.2044/65
	สายคลองวัด - ป่าปะคาบ บ้านคลองวัด หมู่ที่ 1	วันที่ทดสอบ	2 สิงหาคม 2565
สถานที่	ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	หมายเลขเครื่อง	16005866
ชนิดวัสดุ	ก้อนคอนกรีต	CALIBRATION EQUATION	$y = 10.08x101.96$
ผู้แจ้งทดสอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตุม		
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภิวัฒน์		

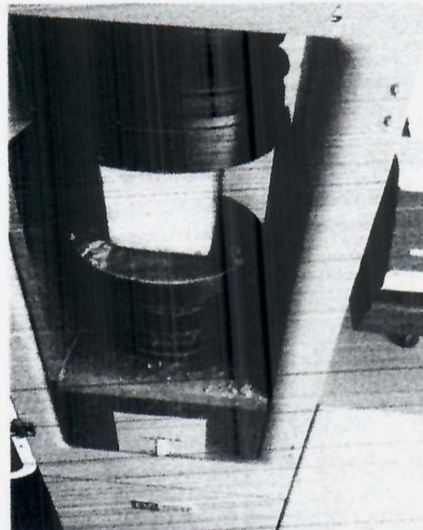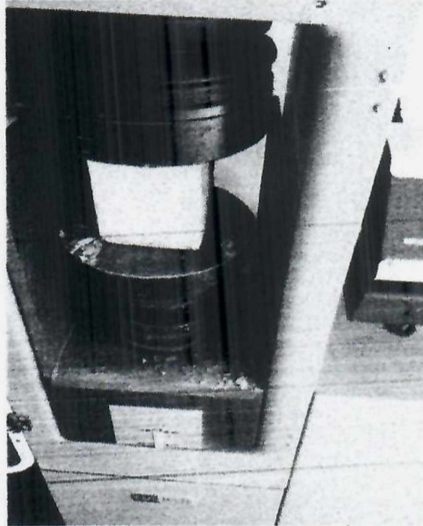

๒๒

200


ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
 กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.2044/65
 วันที่ทดสอบ 2 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ทดสอบ (นายปณภัทร เปรมโพธิ์)
 นายช่างโยธา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล (นายธีระยุทธ เสงี่ยมโคกกรวด)
 นายช่างโยธา
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายณรงค์ หงษ์กลาง)
 ผอ.สทว

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายคลองวัด - ป่าปะคาบ บ้านคลองวัด หมู่ที่ 1
 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขเครื่อง 16005866



CALIBRATION EQUATION $y = 10.08x + 101.96$


ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (CUBE) 225.00 cm²

ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภิวัฒน์

ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg./cm ²)	Average (kg./cm ²)	Req.Comp. at 28 day (kg./cm ²)	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	3 กรกฎาคม 2565	8.20	2 สิงหาคม 2565	30	56.63	258.67			
2	3 กรกฎาคม 2565	8.24	2 สิงหาคม 2565	30	55.74	254.61	256.12	240	ถนน คสล
3	3 กรกฎาคม 2565	8.23	2 สิงหาคม 2565	30	55.84	255.07			



ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์
