

องค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่..... ๑๓/๓ (๕)  
วันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๕  
เวลา..... ๑๓.๑๖ น.

ที่ คค ๐๗๑๓/๖๕๖๕

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)  
๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๘๙๐๕/๐๖๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ

๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๘๐๖ เลขที่ ๐๑๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายปรีชา ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑

006



เลขที่ 013

### ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ที่ทำการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก..... นอ. ว. อภิไธย

เป็นค่า..... ควบคุมเงิน ทดสอบทาง

จำนวนเงินบาท..... 90.- บาท

(..... - เกือบหมื่นถ้วน - )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) : สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน ๓ คน  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รูปการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

รายการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายปรีชา	ทะเบียนทดสอบเลขที่	CON.2042/65
สถานที่	ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	วันที่ทดสอบ	2 สิงหาคม 2565
ชนิดวัสดุ	ก้อนคอนกรีต	หมายเลขเครื่อง	16005866
ผู้แจ้งทดสอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตุม	CALIBRATION EQUATION	$y = 10.08x101.96$
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภิวัฒน์		

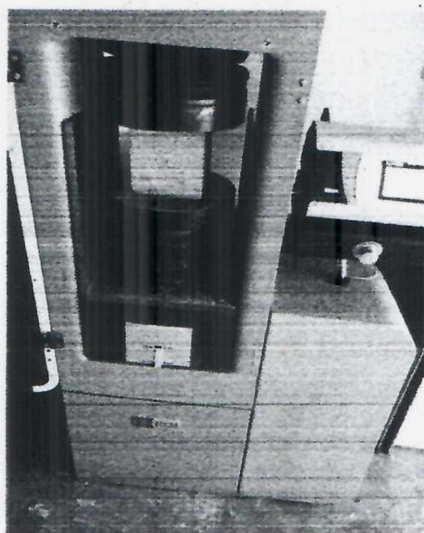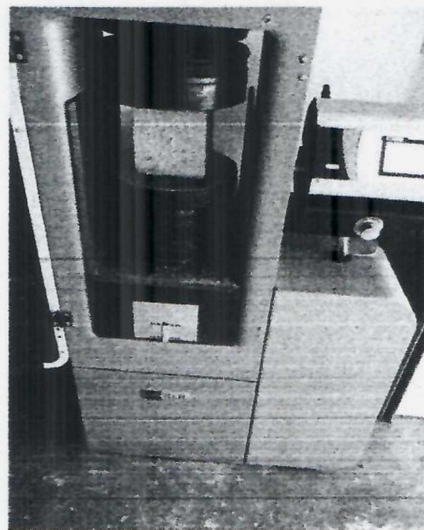


000800

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
 กรมทางหลวงชนบท

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่ 6 สายบ้านนายปรีชา

เนที่ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา



หมายเลขเครื่อง 16005866

CALIBRATION EQUATION  $y = 10.08x + 101.96$

ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (CUBE) 225.00 cm<sup>2</sup>


ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภิวัฒน์

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.2042/65  
 วันที่ทดสอบ 2 สิงหาคม 2565  
 เจ้าหน้าที่ทดสอบ (นายบุญฤทธิ์ เปรมโพธิ์)  
 นายช่างโยธา  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล (นายธีระยุทธ เสี่ยมโคกกรวด)  
 นายช่างโยธา  
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายณรงค์ หงษ์กลาง)  
 ผอ.สทว

ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg./cm <sup>2</sup> )	Average (kg./cm <sup>2</sup> )	Req.Comp. at 28 day (kg./cm <sup>2</sup> )	ชั้นส่วนโครงสร้าง
1	1 กรกฎาคม 2565	8.19	2 สิงหาคม 2565	32	58.54	267.40			
2	1 กรกฎาคม 2565	8.22	2 สิงหาคม 2565	32	56.84	259.63	260.85	240	ถนน คสล
3	1 กรกฎาคม 2565	8.19	2 สิงหาคม 2565	32	55.94	255.52			



ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต  
 ที่: ...
